

नमामि
गंगे



**नमामि गंगे कार्यक्रम
के अंतर्गत सम्पादित कार्यों का विवरण**
(माह सितम्बर 2018 तक अद्यतन)

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
11 मोहिनी रोड़, देहरादून-248001



श्री रोजी अग्रवाल, अधिशासी निदेशक वित्त, द्वारा हरिद्वार नगर में नमामि गंगे कार्यो का निरीक्षण



श्री उदयराज सिंह, कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन गुप नमामि गंगे देहरादून द्वारा,
दिनांक 14.10.2018 को नमामि गंगे कार्यो का निरीक्षण



श्री रूपेश श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, नमामि गंगे नई दिल्ली द्वारा,
दिनांक 16.10.2018 को नमामि गंगे कार्यो का निरीक्षण



प्रस्तावना



उत्तराखण्ड राज्य में पेयजल निगम की स्थापना स्वच्छ पेयजल आपूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं सीवरेज सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन के लिए की गई है।

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड पेयजल निगम के द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण जल आपूर्ति और सीवेज योजनाओं की योजना, सर्वेक्षण, डिजाइन और निष्पादन कार्य उत्तराखण्ड पेयजल निगम के द्वारा किया जाता है।

शासन द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम एक निर्माण एजेंसी के रूप में भी अधिकृत है तथा निगम द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य आदि के भवनों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है।

इस प्रकार उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विकास में अग्रणी योगदान दिया जा रहा है।

हरिद्वार नगर में आई0 एण्ड डी0-1 (जगजीतपुर) कार्य

1. स्वीकृति का सन्दर्भ – P-03/ 2013-14/ 358/ Uttarakhand/Part-2 dt., 16-03-2017
2. अनुबन्ध संख्या – 11/GM/2017-18
3. अनुबन्धित फर्म – **M/s R.K. Engineers, Sales Ltd (Lead Partner)**
(M/s R.K. Engineers, Sales Ltd-M/s Viddut Kumar Jain - JV) D-383,
1st Floor, Akarshan Complex Near Railway Crossing Vibhuti
Khand, Gomti Nagar, Lucknow U.P.-226010

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	8083.29	5527.88
2	अनुरक्षण व्यय 01 वर्ष	398.88	50.00
	योग	8482.17	5577.88

6. कार्य की भौतिक प्रगति : 60 %
7. अवमुक्त धनराशि : 4314.74 लाख
8. कार्य की वित्तीय प्रगति : 4199.40 लाख (52%)
9. योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
	सिविल सम्बन्धी कार्य		
1	सीवेज पम्पिंग स्टेशन पी०डब्ल्यू०डी० नाला	1 नग	98 %
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन आवास विकास नाला	1 नग	98 %
3	न्यू मास्टर पम्पिंग स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट कॉम्प्लेक्स जगजीतपुर	1 नग	92 %
4	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट कॉम्प्लेक्स जगजीतपुर में बाऊन्ड्रीवाल का निर्माण	700 मी०	670 मी०
5	राइजिंग मेन	9300 मी०	7708 मी०
6	प्रेविटी सीवर	2000 मी०	934 मी०
7	नाले किनारे फैनसिंग कार्य (ऊँचाई 2.55 मी०)	3156 मी०	888 मी०
8	डैम कोठी के समीप गंग नहर पर 84 मीटर स्पैन का पुल	कैब्रिकेशन कार्य पूर्ण, सिविल कार्य प्रगति पर, दिनांक 08.11.2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित	
9	प्रेमनगर आश्रम के समीप गंग नहर पर 84 मीटर स्पैन का पुल	वैकल्पिक व्यवस्था (ब्रैकेट लगाकर) के द्वारा कार्य पूर्ण	
10	सिल्ट इजेक्टर चैनल पर 16 मीटर स्पैन का पुल	कैब्रिकेशन कार्य पूर्ण, सिविल कार्य प्रगति पर, दिनांक 08.11.2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित	
	विद्युत एवं यंत्रिक सम्बन्धित कार्य		
1	पम्पिंग प्लान्ट	62 नग	83 %
2	डी०जी० सैट	18 नग	79 %
3	ट्रान्सफारमर	41 नग	80 %
4	फलोमीटर	25 नग	67 %

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	23.09.2017
कार्य समाप्ति की तिथि	22.09.2019
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	22.03.2019



पी.डब्ल्यू.डी. एस.पी.एस.



जगजीतपुर मास्टर पम्पिंग स्टेशन



आवास विकास एस.पी.एस.



बाऊन्ड्री वाल कार्य



फैनसिंग कार्य

हरिद्वार नगर में आई0 एण्ड डी0-1 (जगजीतपुर) कार्य

डैम कोठी के समीप गंग नहर पर 84 मीटर स्पैन का पुल



सिविल कार्य
सिल्ट इजैक्टर चैनल पर 16 मीटर स्पैन का पुल



फैब्रीकेशन कार्य



सिविल कार्य
प्रेमनगर आश्रम के समीप गंग नहर पर 84 मीटर स्पैन का पुल



फैब्रीकेशन कार्य



राईजिंग मेन कार्य / प्रेमनगर आश्रम पर नहर क्रोसिंग

हरिद्वार नगर में आई0 एण्ड डी0-11 (सराय) कार्य

- स्वीकृति का सन्दर्भ – P-03/ 2013-14/ 358/ Uttarakhand/Part-2 dt., 16-03-2017
- अनुबन्ध संख्या – 04/GM/2017-18
- अनुबन्धित फर्म – **M/s R.K. Engineers, Sales Ltd (Lead Partner)**
(M/s R.K. Engineers, Sales Ltd-M/s Viddut Kumar Jain - JV) D-383,
1st Floor, Akarshan Complex Near Railway Crossing Vibhuti
Khand, Gomti Nagar, Lucknow U.P. -226010
- कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)
- कार्य अवधि

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	2975.54	1906.65
2	अनुरक्षण व्यय 01 वर्ष	170.65	20.00
	योग	3146.19	1926.65

कार्य प्रारम्भ की तिथि	25.08.2017
कार्य समाप्ति की तिथि	24.02.2019
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	31.12.2018

- कार्य की भौतिक प्रगति : 74%
- अवमुक्त धनराशि : 1845.94 लाख
- कार्य की वित्तीय प्रगति : 1825.53 लाख (65%)
- योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
	सिविल सम्बन्धी कार्य		
1	सीवेज पम्पिंग स्टेशन कस्सावान का निर्माण कार्य	01 नग	85 %
2	कस्सावान राईजिंग मेन के कार्य	800 मी०	558 मी०
3	पाण्डेवाला पम्पिंग स्टेशन का पुनरोद्धार कार्य	01 नग	कार्य पूर्ण
4	पाण्डेवाला राईजिंग मेन	4508 मी०	4508 मी० (कार्य पूर्ण एवं कमीशनड)
5	फैन्सिंग कार्य	3884 मी०	1045 मी०
6	कस्सावान के समीप गंग नहर पर 84 मीटर स्पैन का पुल	फैब्रीकेशन कार्य पूर्ण, सिविल कार्य प्रगति पर. दिनांक 08.11.2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित	
	विद्युत एवं यांत्रिक सम्बन्धित कार्य		
1	पम्पिंग प्लान्ट	12 नग	90 %
2	डी०जी० सैट	2 नग	90 %
3	ट्रान्सफार्मर	1 नग	90 %
4	फलोमीटर	3 नग	66 %



पाण्डेवाला राईजिंग मेन



फैन्सिंग कार्य



सीवेज पम्पिंग स्टेशन कस्सावान



कस्सावान के समीप गंग नहर पर 84 मीटर स्पैन का पुल (सिविल कार्य)



कस्सावान के समीप गंग नहर पर 84 मीटर स्पैन का पुल (फैब्रीकेशन कार्य)

हरिद्वार नगर के जगजीतपुर में 68 MLD सीवेज शोधन संयंत्र का 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य''



- स्वीकृति का सन्दर्भ – P-03/2013-14/ 358/ Uttarakhand / Part-1 dt. 16-03-2017
- अनुबन्ध संख्या – 21/GM/2017-18
- अनुबन्धित फर्म – **M/s HNB Engineers (Haridwar) Pvt. Ltd.,**
(SPV of HNB Engineer Pvt. Ltd.),
Engineers & Trunkey Contractors, Henabh Center, 1326, Shukrawar
Peth, Off. Bajirao Road, Pune
- कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

हाईब्रिड एन्यूटी आधारित
पी०पी०पी० मॉडल

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	11026.18	9930.00
2	अनुरक्षण व्यय 15 वर्ष	12006.00	2295.78
	योग	23032.18	12225.78

कार्य प्रारम्भ की तिथि	19.02.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	18.02.2020
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	31.03.2019

5. कार्य अवधि

- कार्य की भौतिक प्रगति : 46 %
- अवमुक्त धनराशि : 2145.22 लाख
- कार्य की वित्तीय प्रगति : 2145.22 लाख (19.46%)
- योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र० सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति	
			सिविल कार्य	वि० एण्ड यॉ० कार्य
	सिविल सम्बन्धी कार्य			
1	68 MLD एस०टी०पी० निर्माण कार्य			
i	स्ट्रिंगिंग चैम्बर	01 नग	स्लैब लेवल तक कार्य पूर्ण	40 %
	मेनुअल/मेकेनिकल स्क्रीन चैनल	01 नग		
	ग्रिट चैम्बर/ग्रिट बाईपास चैनल एवं पार्शल फ्लूम	01 नग		
	डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर	01 नग		
ii	सिकवेन्सियल बैच रिऐक्टर	01 नग	राफ्ट 75% पूर्ण, दीवार कार्य 20% पूर्ण	30 %
iii	क्लोरीन कोन्टेक्ट टैंक	01 नग	राफ्ट तक कार्य पूर्ण, दीवार कार्य प्रगति पर	20%
iv	ऐयर ब्लोवर रूम + डी०जी० रूम + वर्क शॉप एवं टूल रूम + एच०टी० सब स्टेशन रूम	01 नग	गेन्ट्री बीम तक कार्य पूर्ण	20 %
	एडमिन बिल्डिंग, कॉन्फ्रेन्स एवं लेबोरेट्री बिल्डिंग	01 नग	भूतल से ऊपर कॉलम कार्य पूर्ण, स्लेब कार्य प्रगति पर	
v	क्लोरीनेशन/टोनर यार्ड	01 नग	कॉलम कार्य प्रगति पर	
vi	स्लज थिकनर-1	01 नग	आर.सी.सी. कार्य पूर्ण	20 %
	स्लज थिकनर-2	01 नग	आर.सी.सी. कार्य पूर्ण	20 %
	सेन्ट्रीफ्यूज यूनिट	01 नग	स्लैब कार्य प्रगति पर	30 %
	स्लज सम्प, पोलिमेर डोजिंग यूनिट	01 नग	कार्य पूर्ण	30 %
	सेन्ट्रेट सम्प	01 नग	कार्य पूर्ण	30 %



स्लज थिकनर-1




स्लज थिकनर-2



क्लोरीनेशन रूम

हरिद्वार नगर के जगजीतपुर में 68 MLD सीवेज शोधन संयंत्र का 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य

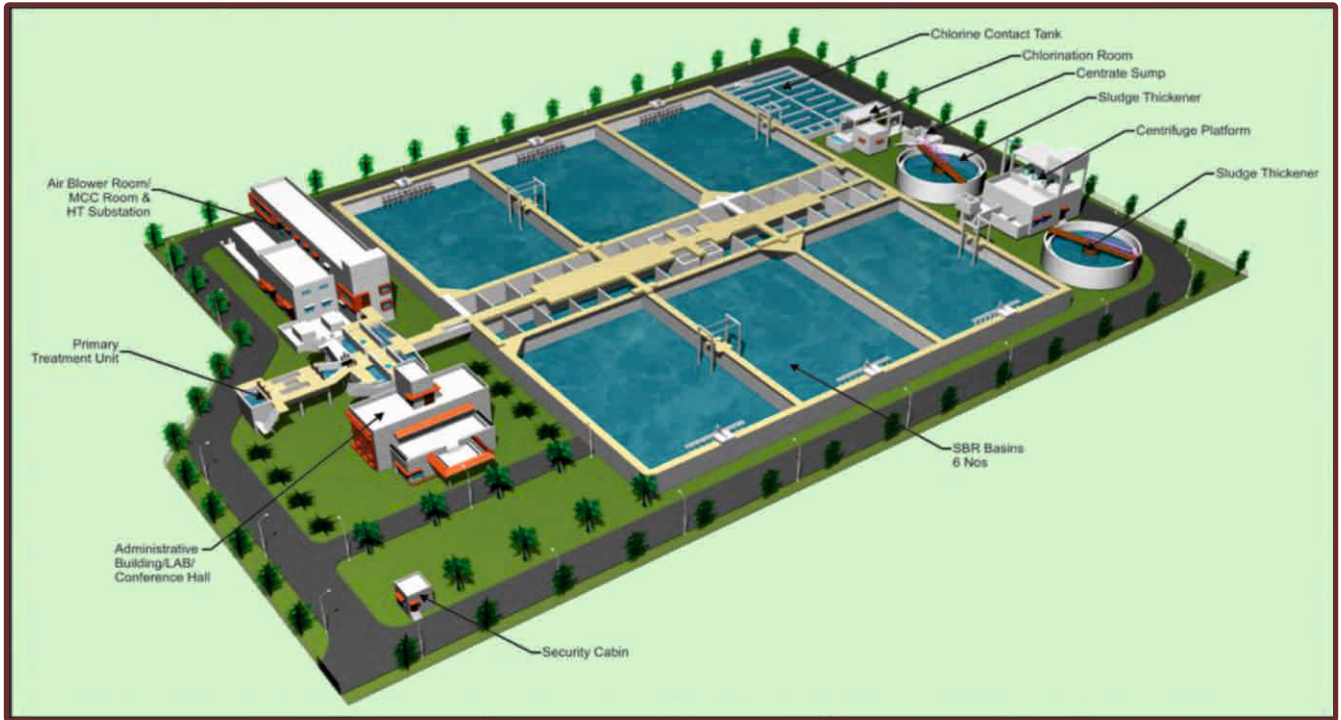

हरिद्वार नगर के जगजीतपुर में 68 MLD सीवेज शोधन संयंत्र का 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य''



क्लोरीन कोन्टेक्ट टैंक



प्राईमरी यूनिट



ब्लॉवर रूम



एडमिन बिल्डिंग



सेन्ट्रेट सम्प



सैन्ट्रीफ्यूज स्लज सम्प/पम्प हाऊस



सिक्वोरिटी केबिन



सिकवेन्सियल बैच रिऐक्टर

हरिद्वार नगर के सराय में 14 MLD, सीवेज शोधन संयंत्र का 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य



- स्वीकृति का सन्दर्भ – P-03/2013-14/ 358/ Uttarakhand / Part-1 dt. 16-03-2017
- अनुबन्ध संख्या – 21/GM/2017-18
- अनुबन्धित फर्म – **M/s HNB Engineers (Haridwar) Pvt. Ltd.**,
(SPV of HNB Engineer Pvt. Ltd.),
Engineers & Trunkey Contractors, Henabh Center, 1326, Shukrawar
Peth, Off. Bajirao Road, Pune
- कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

हाईब्रिड एन्यूटी आधारित
पी०पी०पी० मॉडल

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	2500.66	4140.00
2	अनुरक्षण व्यय 15 वर्ष	1804.24	787.01
	योग	4304.90	4927.01

कार्य प्रारम्भ की तिथि	19.02.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	18.02.2020
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	31.03.2019

- कार्य की भौतिक प्रगति : 57%
- अवमुक्त धनराशि : 827.17 लाख
- कार्य की वित्तीय प्रगति : 827.17 लाख (33.08%)
- योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र० सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति		
			सिविल कार्य	वि० एण्ड यॉ० कार्य	
	सिविल सम्बन्धी कार्य				
1	14 MLD एस०टी०पी० निर्माण कार्य				
i	प्राईमरी ट्रीटमेंट यूनिट	स्टिलिंग चैम्बर	01 नग	भूतल से ऊपर R.C.C. कॉलम व स्लेब कार्य पूर्ण, दीवार कार्य प्रगति पर	50 %
		मेनुअल/ मेकेनिकल स्क्रीन चैनल	01 नग		
		ग्रिट चैम्बर/ग्रिट बाईपास चैनल एवं पार्श्ल फ्लूम	01 नग		
		डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर	01 नग		
ii	सिकवेन्सियल बैच रिपेक्टर	01 नग	राफ्ट कार्य पूर्ण, दीवार कार्य 40% पूर्ण	35%	
iii	क्लोरीन कोन्टेक्ट टैंक	01 नग	बाहरी दीवारें 95% पूर्ण	25%	
iv	ऐयर ब्लोवर रूम + डी०जी० रूम + वर्क शॉप एवं टूल रूम + एच०टी० सब स्टेशन रूम एडमिन बिल्डिंग, कॉन्फेन्स एवं लेबोरेट्री बिल्डिंग	01 नग	भूतल का स्लेब कार्य पूर्ण, प्रथम तल के कॉलम कार्य प्रगति पर	30%	
v	क्लोरीनेशन/टोनर यार्ड	01 नग	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	25 %	
vi	स्लज हेन्डलिंग यूनिट	स्लज थिकनर-1	01 नग	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	25 %
		सेन्ट्रीफ्यूज यूनिट	01 नग	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	40 %
		स्लज सम्प, पोलीमर डॉजिंग यूनिट	01 नग	कार्य पूर्ण	40 %
		सेन्ट्रेट सम्प	01 नग	कार्य पूर्ण	40 %



क्लोरीन कोन्टेक्ट टैंक



ब्लोवर रूम एवं एडमिन बिल्डिंग



सेन्ट्रीफ्यूज स्लज सम्प

हरिद्वार नगर के सराय में 14 MLD, सीवेज शोधन संयंत्र का 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य



हरिद्वार नगर के सराय में 14 MLD, सीवेज शोधन संयंत्र का 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य



स्लज थिकनर



प्राईमरी ट्रीटमेन्ट यूनिट



सीक्वेन्सिंग बैच रिऐक्टर



प्राईमरी ट्रीटमेन्ट यूनिट



क्लोरीनेशन / टोनर यार्ड



पोलीमर डोजिंग यूनिट



सेन्ट्रीफ्यूज यूनिट



सिक्वोरिटी केबिन

हरिद्वार नगर के 27 MLD , एस0टी0पी0 जगजीतपुर का टर्शियर शोधन, आनलाईन मॉनीटरिंग, उच्चीकरण कार्य



- स्वीकृति का सन्दर्भ – P-03/2013-14/ 358/ Uttarakhand / Part-3 dt. 16-03-2017
- अनुबन्ध संख्या – 17/GM/2017-18
- अनुबन्धित फर्म – **M/s VA Tech WABAG Ltd. ,**
WABAG House No. 17, 200 feet Thuraipakkam- Pallavaram Main Road
Sunnamba, Kolathur, Chennai

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	833.71	760.77
2	अनुसंधान व्यय 15 वर्ष	1131.21	539.46
	योग	1964.92	1300.23

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	01.12.2017
कार्य समाप्ति की तिथि	28.02.2019
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	31.12.2018

- कार्य की भौतिक प्रगति : 42%
- अवमुक्त धनराशि : 335.04 लाख
- कार्य की वित्तीय प्रगति : 240.16 लाख (29%)
- योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
	सिविल सम्बन्धी कार्य		
1	फिल्टर फीड सम्प	01 नग	राफ्ट कार्य 50% पूर्ण
2	डयूल मीडिया फिल्टर	04 नग	फाउन्डेशन कार्य 90% पूर्ण फ्रेमवर्क कार्य 50% पूर्ण
3	स्लज ड्राईंग बैड पुनरोद्धार कार्य	12 नग	08 पूर्ण
4	डाईजेस्टर डोम का पुनरोद्धार कार्य	01 नग	15 %
5	गैस हॉल्डर का पुनरोद्धार कार्य	02 नग	0 %
	विद्युत एवं यांत्रिक सम्बन्धित कार्य		
1	ब्लोवर	3 नग	15%
2	ऑनलाईन मॉनिटरिंग	2 जॉब	80%
3	फिल्टर फीड पम्प एवं फिल्टर बैंक वास पम्प	5 नग	15%
4	डी0जी0 सैट	1 नग	10%



डयूल मीडिया फिल्टर फ्रेमवर्क



डयूल मीडिया फिल्टर फाउन्डेशन



फिल्टर फीड सम्प



स्लज ड्राईंग बैड

हरिद्वार नगर के 18 MLD, एस0टी0पी0 सराय का टर्शियर शोधन, आनलाईन मॉनीटरिंग, हेतु 15 वर्ष के रखरखाव सहित उच्चीकरण कार्य”



- स्वीकृति का सन्दर्भ – P-03/2013-14/ 358/ Uttarakhand / Part-3 dt. 16-03-2017
- अनुबन्ध संख्या – 17/GM/2017-18
- अनुबन्धित फर्म – **M/s VA Tech WABAG Ltd.** ,
WABAG House No. 17, 200 feet Thuraipakkam - Pallavaram Main Road
Sunnamba, Kolathur, Chennai

4. कार्य लागत का विवरण (रू० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	532.19	485.57
2	अनुरक्षण व्यय 15 वर्ष	767.12	342.67
	योग	1299.31	838.24

5. कार्य अवधि


कार्य प्रारम्भ की तिथि	01.12.2017
कार्य समाप्ति की तिथि	28.02.2019
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	31.12.2018

- कार्य की भौतिक प्रगति : 32%
- अवमुक्त धनराशि : 248.96 लाख
- कार्य की वित्तीय प्रगति : 116.92 लाख (29%)
- योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
	सिविल सम्बन्धी कार्य		
1	फिल्टर फीड सम्प	01 नग	रिनफोर्समेन्ट बाईडिंग कार्य प्रगति पर
2	डयूल मीडिया फिल्टर	03 नग	30% फेब्रिकेशन कार्य पूर्ण
	विद्युत एवं यांत्रिक सम्बन्धित कार्य		
1	फिल्टर फीड पम्प एवं फिल्टर बैंक वास पम्प	5 नग	25%
2	डी०जी० सैट	1 नग	10%
3	ट्रान्सफारमर	1 नग	10%
4	ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम	2 नग	80%



फिल्टर फीड सम्प

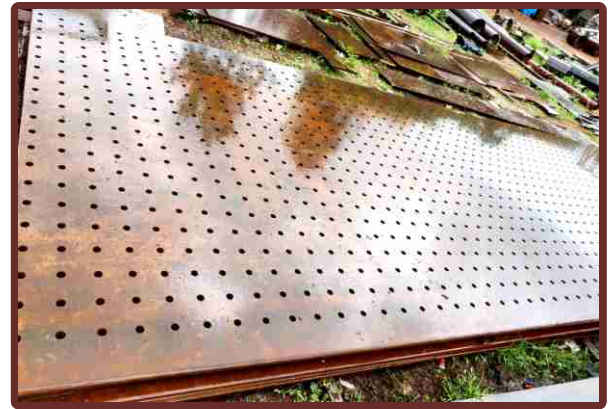

डयूल मीडिया फिल्टर

हरिद्वार नगर के अरिहन्त विहार एवं न्यू विष्णु गार्डन कनखल हरिद्वार में सीवर लाईन बिछाने सम्बन्धी कार्य



- स्वीकृति का सन्दर्भ – T-03/2017-18/138/Uttarakhand Dt. 16 January 2018
- अनुबन्ध संख्या – 23/GM/2017-18
- अनुबन्धित फर्म – मै0 एस०एम० कन्सट्रक्शन (लीड पार्टनर),
(मै० एस०एम० कन्सट्रक्शन, आगरा-मै० बालाजी कन्सट्रक्शन गैलरी, हरिद्वार
-जे०वी) 109 अदन बाग एक्टेन्शन, दयाल बाग, आगरा।

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	468.45	221.93
	योग	468.45	221.93

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	05.04.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	04.09.2018
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	30.11.2018

- कार्य की भौतिक प्रगति : 74%
- अवमुक्त धनराशि : 105.44 लाख
- कार्य की वित्तीय प्रगति : 84.03 लाख (18%)
- योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
	सिविल सम्बन्धी कार्य		
1	सीवर लाईन बिछाने का कार्य	3652 मी०	2700 m
2	नाला टैपिंग	01 नग	15 %
3	इंरिगेशन माईनर केनाल क्रॉसिंग	01 नग	0



पाईप लाईन कार्य



बैडिंग कार्य



शटरिंग के उपयोग से
खुदान कार्य

मुनि की रेती नगर में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 के कार्य जिसमें आई0 एण्ड डी0 हेतु 01 वर्ष एवं एस0टी0पी0 हेतु 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य



1. स्वीकृति का सन्दर्भ – T-03/2012-13/0175/MWW-Muni Ki Reti dt. 29.03.2017
2. अनुबन्ध संख्या – 20/GM/2017-18
3. अनुबन्धित फर्म – **M/s R.K. Engineers, Sales Ltd (Lead Partner)**
(M/s R.K. Engineers, Sales Ltd M/s Viddut Kumar Jaiti JV) D-383,
1st Floor, Akarshan Complex Near Railway Crossing Vibhuti
Khand, Gomti Nagar, Lucknow U.P. -226010

4. कार्य लागत का विवरण (₹० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	3875.39	3797.34
2	01 वर्ष आई0 एण्ड डी0 एवं 15 वर्षीय एस0टी0पी0 का अनुरक्षण व्यय	3711.61	2904.18
	योग	7587.00	6701.52

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	17.02.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	16.08.2019
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	16.06.2019

6. कार्य की भौतिक प्रगति : 30%
7. अवमुक्त धनराशि : 1761.116 लाख
8. कार्य की वित्तीय प्रगति : 955.116 लाख (29.80%)
9. योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
	सिविल सम्बन्धी कार्य		
1	एस0पी0एस0 मुनि की रेती	1 नग	70 %
2	एम0पी0एस0 चन्द्रभागा	1 नग	80 %
3	राईजिंग मेन	3575 मी0	3412 m
4	05 एम0एल0 डी0 एस0टी0पी0, चोरपानी	01 नग	5%
6	7.50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, ढालवाला	01 नग	5%
7	नाला टैपिंग	03 नग	5%
	विद्युत एवं यॉत्रिक सम्बन्धित कार्य		
	पम्पिंग प्लान्ट	08 नग	25%
2	डी०जी० सैट	02 नग	80 %
3	ट्रान्सफार्मर	02 नग	15 %
4	फ्लोमीटर	02 नग	80 %



05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 चोरपानी, बॉन्ड्रीवाल कार्य



एम0पी0एस0 चन्द्रभागा



एस0पी0एस0 मुनि की रेती



डी0आई0 पाईपलाइन का बिछानकार्य

ऋषिकेश नगर में आई0 एण्ड डी0 एवं 26 MLD एस0टी0पी0 के कार्य जिसमें आई0 एण्ड डी0 हेतु 01 वर्ष एवं एस0टी0पी0 हेतु 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य



1. स्वीकृति का सन्दर्भ – T-03/2016-17/452/NMCG, dt. 16.03.2017
2. अनुबन्ध संख्या – 02/GM/2018-19
3. अनुबन्धित फर्म – M/s- GDCL-EMIT JV (Lead Partner M/s- Gannon Dunkerley & Co. Ltd 2nd Partner M/s Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l) B- 228, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi -110020

4 कार्य लागत का विवरण (₹० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	7884.97	7242.95
2	01 वर्ष आई0 एण्ड डी0 एवं 15 वर्षीय एस0टी0पी0 का अनुरक्षण व्यय	5710.93	5394.51
	योग	13595.90	12637.46

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	31.05.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	30.11.2019
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	30.09.2019

6. कार्य की भौतिक प्रगति : 10%
7. अवमुक्त धनराशि : 1779.209 लाख
8. कार्य की वित्तीय प्रगति : 1054.00 लाख (14.55%)
9. योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
	सिविल सम्बन्धी कार्य		
1	26 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0	01 नग	7% BEP की वॉलिंग का कार्य पूर्ण
2	एस0पी0एस0, मायाकुण्ड	01 नग	5%
3	एस0पी0एस0, सर्वहारा नगर	01 नग	5%
4	एस0पी0एस0, बापूग्राम	01 नग	5%
5	एस0पी0एस0 का पुर्नगठन कार्य	02 नग	2%
6	राईजिंग मेन	2200 मी0	2%
7	ऑऊट फॉल ग्रेविटी सीवर	12645 मी०	5%
8	नाला टैपिंग	03 नग	2%
	विद्युत एवं यंत्रिक सम्बन्धित कार्य		
1	पम्पिंग प्लान्ट	13 नग	10%
2	डी०जी० सैट	04 नग	10%
3	ट्रान्सफार्मर	06 नग	10%
4	फलोमीटर	05 नग	10%



26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0



एस0टी0पी0 स्थल

स्वर्गाश्रम स्थित 3.00 MLD एस0टी0पी0 अपग्रेडेशन एवं 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य

1. स्वीकृति का सन्दर्भ – T-03/2016-17/647, dt. 29.03.2017
2. अनुबन्ध संख्या – 18/GM/2017-18
3. अनुबन्धित फर्म – Aastha Enviro Engineers Pvt. Ltd. Plot No.- 543 Y, Pace City II, Sec-37, Distt.- Gurgaon-122001

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	199.76	196.00
2	15 वर्ष का अनुरक्षण व्यय	235.92	216.86
	योग	435.68	412.86

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	01.01.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	30.06.2018
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	15.11.2018

6. कार्य की भौतिक प्रगति : 90.00%
7. अवमुक्त धनराशि : 228.630 लाख
8. कार्य की वित्तीय प्रगति : 138.00 लाख (69.50%)
9. योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र० सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
	सिविल सम्बन्धी कार्य		
1	सिविल कार्य	01 जॉब	90%
2	टर्सरी ट्रीटमेंट कार्य	02 नग	40%
	ऑनलाईन मानिटोरिंग	01 जॉब	90%



ऑनलाईन मानिटोरिंग रूम



3.00 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0



डी0जी0 सेट

तपोवन नगर के 3.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के ऑनलाईन मॉनीटरिंग एव 15 वर्ष के रखरखाव सहित कार्य

- स्वीकृति का सन्दर्भ — T-03/2016-17/638/NMCG Dated 16-03-17
- अनुबन्ध संख्या — 09/GM/2017-18
- अनुबन्धित फर्म — M/s Axis Nano Technology Pvt. Ltd, S.C.F.-78, 2nd/3rd Floor, Phase-II, Mohali- 160055

कार्य पूर्ण

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	133.76	59.00
2	15 वर्ष का अनुरक्षण व्यय	74.66	42.96
	योग	208.42	101.96

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	15.09.2017
कार्य समाप्ति की तिथि	15.03.2018
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	कार्य पूर्ण

- कार्य की भौतिक प्रगति : 100%
- अवमुक्त धनराशि : 66.43 लाख
- कार्य की वित्तीय प्रगति : 66.43 लाख (20%)
- योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
1	विद्युत एवं यंत्रिक सम्बन्धित कार्य 3.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर इनलेट एवं आउटलेट पर ऑनलाईन मॉनीटरिंग सिस्टम के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	1 जॉब	100%

Inlet & Outlet Data Display on panel



Online Graph & data display on website



श्रीनगर नगर में श्रीनगर आई0 एण्ड डी0 विद् एस0टी0पी0 योजना के कार्य का 15 वर्ष एस0टी0पी0 के रखरखाव सहित निर्माण कार्य



1. स्वीकृति का सन्दर्भ – T-03/2013-14/383/MWW-Srinagar Dated 29 March 2017
2. अनुबन्ध संख्या – 19/GM/2017-18
3. अनुबन्धित फर्म – **M/s ECO protection Engineers Pvt. Ltd.**
Plot No. 943, 54th Street, TVS Colony,
Anna Nagar West Extension
Chennai – 600101

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	1280.42	1427.22
2	15 वर्ष का अनुरक्षण व्यय	970.97	646.02
	योग	2251.39	2073.24

6. कार्य की भौतिक प्रगति : 65%
7. अवमुक्त धनराशि : 950.932 लाख
8. कार्य की वित्तीय प्रगति : 825.634 लाख (58%)
9. योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
	सिविल सम्बन्धी कार्य		
1	1.0 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0	1 नग	50 %
2	सीवेज पम्पिंग स्टेशन	1 नग	60 %
3	नाला टैपिंग	10 नग	60 %
4	पूर्व निर्मित नाला टैपिंग के मरम्मत कार्य	07 नग	40 %
5	राईजिंग मेन	800 मी0	80 मी0
6	कैरियर लाईन	1600 मी0	800 मी0

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	17.01.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	16.01.2019
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	30.11.2018



नाला टैपिंग – प्रगति विहार



1.0 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0
(C-Tech Basin)



1.0 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (एम0पी0एस0)



1.0 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (एडमिन
बिल्डिंग)

श्रीनगर नगर में श्रीनगर 3.50 MLD एस0टी0पी0 का अपग्रेडेशन योजना के कार्य का 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य



1. स्वीकृति का सन्दर्भ – T-03/2016-17/646/NMCG Dated 29 March 2017
2. अनुबन्ध संख्या – 19/GM/2017-18
3. अनुबन्धित फर्म – **M/s ECO protection Engineers Pvt. Ltd.**
Plot No. 943, 54th Street, TVS Colony,
Anna Nagar West Extension
Chennai– 600101

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	729.48	350.00
2	15 वर्ष का अनुरक्षण व्यय	811.02	254.84
	योग	1540.50	604.84

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	17.01.2017
कार्य समाप्ति की तिथि	16.01.2019
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	30.11.2018

6. कार्य की भौतिक प्रगति : 60%
7. अवमुक्त धनराशि : 262.366 लाख
8. कार्य की वित्तीय प्रगति : 172.616 लाख (49%)
8. योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
	सिविल सम्बन्धी कार्य		
1	Equalization Tank	1 नग	70 %
2	Anoxic Tank	1 नग	60%
3	Aeration Tank	1 नग	60%
4	Rapid sand filter	1 नग	50%
5	Secondary Clarifier	1 नग	30%



3.50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 अपग्रेडेशन (Equalization Tank)



3.50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 अपग्रेडेशन (Anoxic Tank/Aeration Tank/RSF)

रूद्रप्रयाग आई0 एण्ड डी0 विद् एस0टी0पी0 योजना के कार्यों का 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य



- स्वीकृति का सन्दर्भ – T-03/2016-17/460/NMCG Dated 16 March 2017
- अनुबन्ध संख्या – 15/GM/2017-18
- अनुबन्धित फर्म – **JV- JBM-CEIPL**
M/s Jai Bhusan Malik (**Lead Partner**), 231/5, Sunder Nagar,
Patiala- 147001 (Punjab)
M/s Confident Engineering India Pvt. Ltd. (**Second Partner**), 678/1,
Kurichi Village, Madukkarai Road, Sidco Post, Coimbatore -641021

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	755.10	629.30
2	15 वर्ष का अनुरक्षण व्यय	559.44	406.78
	योग	1314.54	1036.08

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	20.11.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	19.02.2019
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	31.12.2018

- कार्य की भौतिक प्रगति : 50%
- अवमुक्त धनराशि : 552.50 लाख
- कार्य की वित्तीय प्रगति : 304.667 लाख (48%)
- योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
	सिविल सम्बन्धी कार्य		
1	एस0टी0पी0 -1 (75 के0एल0डी0)	1 नग	80 %
2	एस0टी0पी0 -2 (100 के0एल0डी0)	1 नग	60 %
3	एस0टी0पी0 -3 (75 के0एल0डी0)	1 नग	50 %
4	एस0टी0पी0 -4 (100 के0एल0डी0)	1 नग	40 %
5	एस0टी0पी0 -5 (125 के0एल0डी0)	1 नग	25 %
6	एस0टी0पी0 -6 (50 के0एल0डी0)	1 नग	15 %
7	नाला टेपिंग कैरियर लाईन सहित	8 नग	10 %



एस0टी0पी0-1 (अनूप नेगी स्कूल)



एस0टी0पी0-2 (रुद्रा कैम्पलेक्स)



एस0टी0पी0-3 (बस अड्डा)



एस0टी0पी0-4 (निकट SBI / मस्जिद)



एस0टी0पी0-5 (स्टील ब्रिज)

कीर्तिनगर नगर आई0 एण्ड डी0 विद् एस0टी0पी0 योजना के कार्य का 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य



कार्य पूर्ण

- स्वीकृति का सन्दर्भ – T-03/2016-17/481/NMCG Dated 16 March 2017
- अनुबन्ध संख्या – 10/GM/2017-18
- अनुबन्धित फर्म – M/s Aastha Enviro Engineers Pvt Ltd,
543Y Pace City-II, Sector-37, Gurugram
(Gurgaon) Haryana

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	195.43	180.13
2	15 वर्ष का अनुरक्षण व्यय	228.03	197.29
	योग	423.46	377.42

- कार्य की भौतिक प्रगति : 100%
- अवमुक्त धनराशि : 196.405 लाख
- कार्य की वित्तीय प्रगति : 170.545 लाख (95%)
- योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
	सिविल सम्बन्धी कार्य		
1	एस0टी0पी0 -1 (50 के0एल0डी0)	1 नग	100 %
2	एस0टी0पी0 -2 (10 के0एल0डी0)	1 नग	100%
3	नाला ट्रेपिंग कैरियर लाईन सहित	2 नग	100%

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	15.09.2017
कार्य समाप्ति की तिथि	30.06.2018
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	कार्य पूर्ण



नाला ट्रेपिंग
(10 के0एल0डी0 एस0टी0पी0)



एस0टी0पी0-50 के0एल0डी0
(बी0आर0ओ0 पुल)



नाला ट्रेपिंग
(50 के0एल0डी0 एस0टी0पी0)



एस0टी0पी0-10 के0एल0डी0
(मन्दिर के निकट)

कर्णप्रयाग नगर के आई0 एण्ड डी0 विद एस0टी0पी0 कार्य एवं आई0 एण्ड डी0 कार्य का 1 वर्ष तथा एस0टी0पी0 का 15 वर्ष रखरखाव सहित निर्माण कार्य

1. स्वीकृति का सन्दर्भ :- टी0-03/2016-17/460/एन0एम0सी0जी0, दिनांक 16.03.2017
2. अनुबन्ध संख्या :- 15/जी0एम0/2017-18
3. अनुबन्धित फर्म :- ज्वाइंट वेंचर - (जे0बी0एम0-सी0ई0आई0पी0एल0),
लीड पार्टनर- मै0 जय भूषण मलिक, कान्द्रैक्टर

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	704.56	548.25
2	अनुरक्षण व्यय	334.26	334.26
	योग	882.51	882.51

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	20.11.2017
कार्य समाप्ति की तिथि	19.11.2018
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	19.11.2018

6. कार्य की भौतिक प्रगति : 65%
7. अवमुक्त धनराशि : 354.71 लाख
8. कार्य की वित्तीय प्रगति : 289.71 लाख (52.84%)
9. योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
1	आई0 एण्ड डी0 कार्य		
	कैरियर लाईन	1225 मी0	49%
	इन्टरसेप्शन स्ट्रक्चर	7 नग	54%
2	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट		
	एस0टी0पी0-1 (पुलिस चौकी) - 0.05 एम0एल0डी0	1 नग	96%
	एस0टी0पी0-2 (पुराना पुल) - 0.10 एम0एल0डी0	1 नग	70%
	एस0टी0पी0-3 (सुभाष नगर) - 0.05 एम0एल0डी0	1 नग	60%
	एस0टी0पी0-4 (बी0आर0ओ0 पुल) - 0.05 एम0एल0डी0	1 नग	47%
	एस0टी0पी0-5 (वार्ड नं0 1) - 0.10 एम0एल0डी0	1 नग	75%



सुभाष नगर एस0टी0पी0 निर्माण कार्य



पुराना पुल (पी0डबल्यू0डी0) एस0टी0पी0 निर्माण कार्य



पुलिस चौकी एस0टी0पी0 निर्माण कार्य



वार्ड नं0 1 एस0टी0पी0 कार्य



एलिवेटेड कैरियर लाईन एवं मैनहोल निर्माण

नंदप्रयाग नगर के आई0 एण्ड डी0 विद एस0टी0पी0 कार्य एवं आई0 एण्ड डी0 कार्य का 1 वर्ष तथा एस0टी0पी0 का 15 वर्ष रखरखाव सहित निर्माण कार्य

1. स्वीकृति का सन्दर्भ :- टी0-03/2016-17/479/एन0एम0सी0जी0, दिनांक 29.03.2017
2. अनुबन्ध संख्या :- 15/जी0एम0/2017-18
3. अनुबन्धित फर्म :- ज्वाइंट वैन्चर - (जे0बी0एम0-सी0ई0आई0पी0एल0),
लीड पार्टनर- मै0 जय भूषण मलिक, कान्द्रैक्टर
4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	336.08	245.75
2	अनुरक्षण व्यय	310.24	189.92
	योग	646.32	435.67

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	20.11.2017
कार्य समाप्ति की तिथि	19.08.2018
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	20.10.2018

6. कार्य की भौतिक प्रगति : 91%
7. अवमुक्त धनराशि : 245.23 लाख
8. कार्य की वित्तीय प्रगति : 226.55 लाख (92.19%)
9. योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
1	आई0 एण्ड डी0 कार्य		
	कैरियर लाईन	375 मी0	90%
	इन्टरसेप्सन स्ट्रक्चर	3 नग	68%
2	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट		
	एस0टी0पी0-2 (संगम मार्ग) - 0.05 एम0एल0डी0	1 नग	97%
	एस0टी0पी0-1,3 (फोरेस्ट आफिस) - 0.10 एम0एल0डी0	1 नग	90%



फोरेस्ट ऑफिस एस.टी.पी. निर्माण कार्य



संगम मार्ग एस.टी.पी. निर्माण कार्य



इन्टरसेप्सन स्ट्रक्चर निर्माण कार्य



कैरियर लाईन हेतु स्टील ब्रिज
फैब्रिकेशन कार्य



कैरियर लाईन बिछाने का कार्य

चमोली-गोपेश्वर नगर के आई0 एण्ड डी0 विद एस0टी0पी0 कार्य एवं आई0 एण्ड डी0 कार्य का 1 वर्ष तथा एस0टी0पी0 का 15 वर्ष रखरखाव सहित निर्माण कार्य

1. स्वीकृति का सन्दर्भ :- टी0-03/2016-17/478/एन0एम0एफ0एफ0सी0जी0, दिनांक 29.03.2017
2. अनुबन्ध संख्या :- 15/जी0एम0/2017-18
3. अनुबन्धित फर्म :- ज्वाइंट वेन्चर - (जे0बी0एम0-सी0ई0आई0पी0एल0),
लीड पार्टनर- मै0 जय भूषण मलिक, कान्द्रैक्टर
4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	3112.84	2710.79
2	अनुरक्षण व्यय	3070.38	1837.79
	योग	6183.22	4548.58

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	20.11.2017
कार्य समाप्ति की तिथि	19.02.2019
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	19.01.2019

6. कार्य की भौतिक प्रगति : 52%
7. अवमुक्त धनराशि : 1158.64 लाख
8. कार्य की वित्तीय प्रगति : 970.89 लाख (35.82%)
9. योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
1	आई0 एण्ड डी0 कार्य		
	कैरियर लाईन	1046 मी0	25%
	स्टील ट्रस ब्रिज (80 मी0 स्पान)	1 नग	56%
2	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट		
	एस0टी0पी0-1 (चमोली) - 0.76 एम0एल0डी0	1 नग	72%
	एस0टी0पी0-2 (विवेकानन्द कालोनी) - 1.19 एम0एल0डी0	1 नग	64%
	एस0टी0पी0-3 (पोखरी बैण्ड) - 1.25 एम0एल0डी0	1 नग	52%
	एस0टी0पी0-4 (दीनदयाल उपाध्याय पार्क) - 1.12 एम0एल0डी0	1 नग	56%
	एस0टी0पी0-1 (चमोली पुराना झूला पुल) - 0.05 एम0एल0डी0	1 नग	59%
3	आनलाईन मोनिटरिंग सिस्टम	2 नग	35%



चमोली एस0टी0पी0 निर्माण कार्य



विवेकानन्द कालोनी एस0टी0पी0 कलेक्शन टैंक निर्माण कार्य



पोखरी बैण्ड एस0टी0पी0 सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य



वैतरणी एस0टी0पी0 सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य



चमोली पुराना झूला पुल एस.टी.पी. निर्माण कार्य

जोशीमठ नगर के आई0 एण्ड डी0 विद एस0टी0पी0 कार्य एवं आई0 एण्ड डी0 कार्य का 1 वर्ष तथा एस0टी0पी0 का 15 वर्ष रखरखाव सहित निर्माण कार्य

1. स्वीकृति का सन्दर्भ :- टी0-03/2016-17/470/एन0एम0सी0जी0, दिनांक 16.03.2017
2. अनुबन्ध संख्या :- 19/जी0एम0/2017-18
3. अनुबन्धित फर्म :- मै0 ईको प्रोटेक्शन इंजीनियर्स प्रा0 लि0, चैन्नई

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	2620.92	2921.03
2	अनुरक्षण व्यय	2221.88	1412.33
	योग	4842.80	4333.36

6. कार्य की भौतिक प्रगति : 41%
7. अवमुक्त धनराशि : 1038.92 लाख
8. कार्य की वित्तीय प्रगति : 1038.92 लाख (35.57%)
9. योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
1	आई0 एण्ड डी0 कार्य		
	कैरियर लाईन	2500 मी0	29 %
	नाला फेन्सिंग एवं नाला कवरिंग	1000 मी0	43%
	एप्रोच रोड	1500 मी0	60%
2	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट		
	एस0टी0पी0-1 (मारवाड़ी) - 2.70 एम0एल0डी0	1 नग	28%
	एस0टी0पी0-2 (पोखरी) - 1.08 एम0एल0डी0	1 नग	58%
3	आनलाईन मोनिटरिंग सिस्टम	2 नग	45%

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	17.01.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	16.04.2019
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	31.03.2019



मारवाड़ी एस0टी0पी0 में मिट्टी स्थिरीकरण का निर्माण कार्य



पोखरी एस0टी0पी0 निर्माण कार्य



एप्रोच रोड सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य



कैरियर लाईन बिछाने का कार्य



एप्रोच रोड निर्माण

बद्रीनाथ नगर के आई0 एण्ड डी0 विद एस0टी0पी0 कार्य एवं आई0 एण्ड डी0 कार्य का 1 वर्ष तथा एस0टी0पी0 का 15 वर्ष रखरखाव सहित निर्माण कार्य

- स्वीकृति का सन्दर्भ :- टी0-03/2016-17/453/एन0एम0सी0जी0, दिनांक 29.03.2017
- अनुबन्ध संख्या :- 14/जी0एम0/2017-18
22/जी0एम0/2017-18
01/पी0एम0/2017-18
- अनुबन्धित फर्म :- मै0 आस्था इन्वाइरो इंजीनियर्स प्रा0 लि0, गुड़गांव
श्री दिगम्बर सिंह, चमोली
मै0 अग्रवाल एसोसिएट्स, खतोली

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	913.25	799.21
2	अनुसंधान व्यय	910.40	396.31
	योग	1823.65	1195.52

- कार्य की भौतिक प्रगति : 40%
- अवमुक्त धनराशि : 256.26 लाख
- कार्य की वित्तीय प्रगति : 191.30 लाख (23.94%)
- योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	विवरण	प्रस्तावित	भौतिक प्रगति
1	आई0 एण्ड डी0 कार्य		
	कैरियर लाईन	200 मी0	80%
	स्टील ट्रस ब्रिज (50 मी0 स्पान)	1 नग	59 %
	नाला फेन्सिंग	200 मी0	15%
2	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट		
	एस0टी0पी0-2 (बामणी झूला पुल के पास) - 1.00 एम0एल0डी0	1 नग	37 %
	एस0टी0पी0-3 (मंदिर के नीचे की ओर) - 0.01 एम0एल0डी0	1 नग	46 %
3	आनलाईन मोनिटरिंग सिस्टम	1 नग	25%

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	20.11.2017
कार्य समाप्ति की तिथि	19.05.2019
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	30.04.2019



1.00 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य



कैरियर लाईन हेतु स्टील ब्रिज एबटमेंट निर्माण कार्य



कैरियर लाईन हेतु स्टील ब्रिज फ़ैब्रिकेशन



0.01 एम0एल0डी0 प्री0-फ़ैब0 एस0टी0पी0 निर्माण कार्य

ज्ञानसू स्थित 2.00 MLD एस0टी0पी0 अपग्रेडेडेशन एवं 15 वर्ष के रखरखाव सहित निर्माण कार्य



1. स्वीकृति का सन्दर्भ – T-03/2016-17/584, dt. 16.03.2017
2. अनुबन्ध संख्या – 16/GM/2017-18
3. अनुबन्धित फर्म – M/S Aastha Enviro Engineers Pvt. Ltd. Plot No.- 543 Y, Pace City II, Sec-37, Distt.- Gurgaon-122001

4. कार्य लागत का विवरण (रु० लाख में)

क्र०सं०	विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार	अनुबन्ध के अनुसार
1	कैपिटल लागत	397.284	359.50
2	15 वर्ष का अनुरक्षण व्यय	605.752	399.20
	योग	1003.036	758.70

5. कार्य अवधि

कार्य प्रारम्भ की तिथि	10.12.2017
कार्य समाप्ति की तिथि	10.12.2018
कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि	10.11.2018

6. कार्य की भौतिक प्रगति : 85%
7. अवमुक्त धनराशि : 378.00 लाख
8. कार्य की वित्तीय प्रगति : 288.20 लाख (80%)
9. योजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यों की भौतिक प्रगति

SN	Particular	Unit	Progress
Civil work			
1	Anoxic tank	1 no	95%
2	Foundation for DG set, root air blower, filter feed pump, Centrifuge	1 no	100 %
3	Online monitoring room	1 no	100%
4	Supply of MBBR media/Tubesettler media	100/80 m3	57%/20%
Electrical & Mechanical Work			
1	DG Set	01no	100 %
2	Filter feed pump	04 no	80 %
3	Filter backwash	02 no	80 %
4	Alum dosing	02 no	100 %
5	Poly dosing	02 no	100%
6	Sludge recirculation pump	03 no	100%
7	Return activated sludge pump	02no	60%
8	Air Blower	04 no	80%
9	Online Monitoring System at Inlet & Outlet	1 Job	85%



Anoxic Tank



Online monitoring room



Foundation for DG set



उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा पूर्व में सम्पादित कार्य



18 MLD STP (GAP-I),
JAGJEETPUR ASP)



MAIN SEWAGE PUMPING
STATION, JAGJEETPUR



6 MLD STP (GAPI),
LAKKARGAHAT(WSP)



3.5 MLD STP AT SRINAGAR



2 MLD STP AT GYANSU, UTTARKASHI



Ghat sewer Pumping Station

GHAT SEWER SPS



Vishnughat Pumping Station

VISHNU GHAT SPS




Bairagi Camp Pumping Station

BAIRAGI CAMP SPS



उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा पूर्व में सम्पादित कार्य

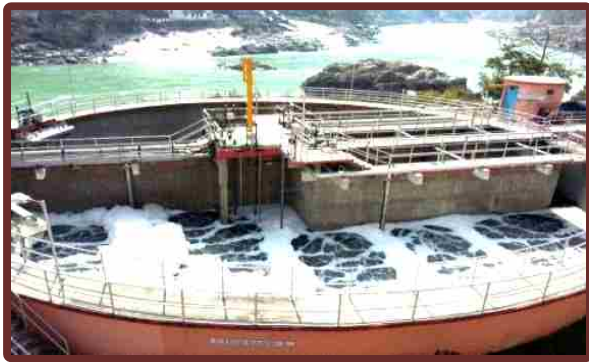

3.5 MLD STP TAPOVAN



18 MLD STP AT SARAI, HARIDWAR



1.4 MLD STP AT DEVPRAYAG



27 MLD STP AT JAGJEETPUR,
HARIDWAR



3 MLD STP AT SWARGASHRAM



20 MLD STP ,MOTHOROWALA,
DEHRADUN



68 MLD STP KARGI, DEHRADUN



0.90 MLD STP KULARI,
MUSSOORIE



उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
11 मोहिनी रोड़, देहरादून-248001
